

Investointien toteutumisvertailu
KOKO ORGANISAATIO

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|---------|------------------------|
| 10 | Korvausinvestoinnit | | | | | | | | |
| 111 | KI / Rakennukset | | | | | | | | |
| 9100 | Kunnanvirasto, K Pv | -38 000,00 | 0,00 | -38 000,00 | -47 412,12 | -9 412,12 | -24,77% | 124,77% | 0,00 |
| Menot | | -38 000,00 | 0,00 | -38 000,00 | -47 412,12 | -9 412,12 | -24,77% | 124,77% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutettu suunniteltua laajempaan. Lisämäärärahan tarve. | | | | | | | | |
| 9101 | Päiväkoti korjaukset, K Pv | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -24 652,62 | 35 347,38 | 58,91% | 41,09% | 0,00 |
| Menot | | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -24 652,62 | 35 347,38 | 58,91% | 41,09% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteuttu korjaustoimenpiteiden osalta. Lämmitysjärjestelmän laajennus suoritetaan. | | | | | | | | |
| 9102 | Päiväkodin muutokset/sisätilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -4 154,72 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -4 154,72 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9130 | Koskenhelmi,dementiaos.huon. K | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -6 044,39 | 33 955,61 | 84,89% | 15,11% | -3 135,58 |
| Menot | | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -6 044,39 | 33 955,61 | 84,89% | 15,11% | -3 135,58 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Jätetään keskeneräisiin. Osa toteutetaan loppuvuodesta. | | | | | | | | |
| 9230 | Koskimakasiini, ulkomaalaus, K | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -7 964,11 | 35,89 | 0,45% | 99,55% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -7 964,11 | 35,89 | 0,45% | 99,55% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutettu suunnitellusti. | | | | | | | | |
| 9231 | Jäähileasema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 468,26 | -15 468,26 | | | 0,00 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 468,26 | -15 468,26 | | | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Määrärahan tarve. Toteutus suurelta osin jäänyt vuodelle 2022. | | | | | | | | |
| 9270 | Kattilalaitos, korjaukset K Pv | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 221,15 | -221,15 | -2,21% | 102,21% | -84 022,34 |
| Menot | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 221,15 | -221,15 | -2,21% | 102,21% | -84 022,34 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| | Toteutettu. Pieni ylitys kustannuksissa. | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|
| 9302 | Liikuntatalo, K, Pa | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | -17 140,90 | 29 859,10 | 63,53% | 36,47% | 0,00 |
| Menot | | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | -17 140,90 | 29 859,10 | 63,53% | 36,47% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Lattian osalta toteutettu. Ovien vaihto vielä loppuvuodesta. | | | | | | | | |
| 9400 | Vanhustentalot, huoneistojen k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -20 988,58 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -20 988,58 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9403 | Koskenhelmen ikkunat sisäpihan | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutus epävarma. | | | | | | | | |
| 9404 | Kirkonkylän koulun salin latti | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | -4 664,08 | 7 335,92 | 61,13% | 38,87% | 0,00 |
| Menot | | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | -4 664,08 | 7 335,92 | 61,13% | 38,87% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutettu lattian osalta. | | | | | | | | |
| 9406 | Koskenhelmen yl.tilojen korj. | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Jää keskeneräisiin, mikäli aloitetaan loppuvuodesta | | | | | | | | |
| 9409 | Terveysasema, sähköulko-ovi | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Tilattu, asennus loppuvuodesta. | | | | | | | | |
| 9412 | Vanhustentalot, talojen raput | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Tilattu, asennus loppuvuodesta. | | | | | | | | |
| 9418 | Koskipirtti, ulkomaalaus, K Pv | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | -17 405,07 | 4 594,93 | 20,89% | 79,11% | 0,00 |
| Menot | | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | -17 405,07 | 4 594,93 | 20,89% | 79,11% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| Toteutettu suunnitellusti. | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 9432 | Hyypiänniemen katon maalaus | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -17 479,59 | -9 479,59 | -118,49% | 218,49% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -17 479,59 | -9 479,59 | -118,49% | 218,49% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Toteutettu. Ruosteenpoistosta lisäkustannus. Lisämäärärahan tarve. | | | | | | | | | |
| 111 | KI / Rakennukset yhteensä | -349 000,00 | 0,00 | -349 000,00 | -168 452,29 | 180 547,71 | 51,73% | 48,27% | -112 301,22 |
| Menot | | -349 000,00 | 0,00 | -349 000,00 | -168 452,29 | 180 547,71 | 51,73% | 48,27% | -112 301,22 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. | | | | | | | | |
| 9271 | Verkoston lämpöuotojen korjau | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Toteutus epävarma. | | | | | | | | | |
| 9309 | Pururadan 5 km alavien os. kor | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Toteutus loppuvuodesta. | | | | | | | | | |
| 9422 | Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Toteutus loppuvuodesta. | | | | | | | | | |
| 9427 | Louhelantien peruskorj, K, Pa | -80 000,00 | -105 800,00 | -185 800,00 | -8 639,92 | 177 160,08 | 95,35% | 4,65% | 0,00 |
| Menot | | -80 000,00 | -105 800,00 | -185 800,00 | -8 639,92 | 177 160,08 | 95,35% | 4,65% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jää keskeneräisiin. Aloitettu elokuun lopussa, asfaltointi keväällä 2023 | | | | | | | | | |
| 9435 | Jv-puhd.ulko-altaan peruskorj. | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Toteutus epävarma. | | | | | | | | | |
| 9441 | Louhelantien vesi/viem.linj.pk | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -3 500,00 | 4 500,00 | 56,25% | 43,75% | 0,00 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -3 500,00 | 4 500,00 | 56,25% | 43,75% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Aloitettu elokuun lopussa. Lisätyönä palopostin poisto | | | | | | | | |
| 9449 | Leikkikentät, K | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | -551,63 | 14 448,37 | 96,32% | 3,68% | 0,00 |
| Menot | | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | -551,63 | 14 448,37 | 96,32% | 3,68% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutus epävarma. | | | | | | | | |
| 9467 | Sahalammen kunnostus ja venevä | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -3 260,00 | 16 740,00 | 83,7% | 16,3% | 0,00 |
| Menot | | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -3 260,00 | 16 740,00 | 83,7% | 16,3% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutus epävarma. Jää mahdollisesti keskeneräisiin | | | | | | | | |
| 9470 | Uimarannan laiturit | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | -28 040,76 | 959,24 | 3,31% | 96,69% | 0,00 |
| Menot | | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | -28 040,76 | 959,24 | 3,31% | 96,69% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutettu. | | | | | | | | |
| 9471 | Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -853,50 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -853,50 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9601 | Jv-puhd/Kennomuovien uusiminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -18 244,09 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -18 244,09 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 113 | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -198 000,00 | -105 800,00 | -303 800,00 | -43 992,31 | 259 807,69 | 85,52% | 14,48% | -19 097,59 |
| Menot | | -198 000,00 | -105 800,00 | -303 800,00 | -43 992,31 | 259 807,69 | 85,52% | 14,48% | -19 097,59 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 116 | KI / Koneet ja kalusto | | | | | | | | |
| 9132 | Koskenhelmi, koneet ja laitt,K | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Laitteiston uusimiseen ei ole ollut tarvetta. | | | | | | | | |
| 116 | KI / Koneet ja kalusto yhteensä | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | Korvausinvestoinnit yhteensä | -555 000,00 | -105 800,00 | -660 800,00 | -212 444,60 | 448 355,40 | 67,85% | 32,15% | -131 398,81 |
| Menot | | -555 000,00 | -105 800,00 | -660 800,00 | -212 444,60 | 448 355,40 | 67,85% | 32,15% | -131 398,81 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 30 | Uusinvestoinnit | | | | | | | | |
| 310 | UI / Maa- ja vesialueet | | | | | | | | |
| 9550 | Kiinteä omaisuus/maa-alueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 434,40 |
| Menot | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| 310 | UI / Maa- ja vesialueet yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 434,40 |
| Menot | | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| 313 | UI / Kiinteät rakent. ja lait. | | | | | | | | |
| 9307 | Ulkokuntoilupaikka kuntoilupor | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | -33 233,83 | -16 233,83 | -95,49% | 195,49% | 0,00 |
| Menot | | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | -33 233,83 | -16 233,83 | -95,49% | 195,49% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutettu, muuri aiheuttanut lisäkustannuksia. Lisämäärärahan tarve. | | | | | | | | |
| 9451 | Runkolinja Säästökuja Metsätie | -68 000,00 | 0,00 | -68 000,00 | -11 244,20 | 56 755,80 | 83,46% | 16,54% | 0,00 |


INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Menot | | -68 000,00 | 0,00 | -68 000,00 | -11 244,20 | 56 755,80 | 83,46% | 16,54% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Aloitettu elokuun lopussa. | | | | | | | | |
| 9452 | Runkolinja Säästökuja Metsätie | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -6 919,07 | 23 080,93 | 76,94% | 23,06% | 0,00 |
| Menot | | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -6 919,07 | 23 080,93 | 76,94% | 23,06% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Aloitettu elokuun lopussa. | | | | | | | | |
| 313 | UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -51 397,10 | 63 602,90 | 55,31% | 44,69% | 0,00 |
| Menot | | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -51 397,10 | 63 602,90 | 55,31% | 44,69% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 316 | UI / Koneet ja kalusto | | | | | | | | |
| 9306 | Telamönkijä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -15 000,00 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -15 000,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9443 | Ruohonleikkuri, U, Pv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -12 284,48 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -12 284,48 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9463 | Koulun keittiön laitteiden uus | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Menot | | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,0% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Laitteiston uusimiseen ei ole ollut tarvetta. | | | | | | | | |
| 9560 | ATK-hankinnat, U | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -803,30 | 29 196,70 | 97,32% | 2,68% | -3 018,00 |
| Menot | | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -803,30 | 29 196,70 | 97,32% | 2,68% | -3 018,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Toteutus kesken. | | | | | | | | |
| 9561 | Palvelin (ICT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -10 187,75 |
| Menot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -10 187,75 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 316 | UI / Koneet ja kalusto yhteensä | -38 000,00 | 0,00 | -38 000,00 | -803,30 | 37 196,70 | 97,89% | 2,11% | -40 490,23 |
| Menot | | -38 000,00 | 0,00 | -38 000,00 | -803,30 | 37 196,70 | 97,89% | 2,11% | -40 490,23 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 320 | UI / Osakkeet ja osuudet | | | | | | | | |
| 9570 | Käyttöomaisuuden osto/osakkeet | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -711 200,00 | -11 200,00 | -1,6% | 101,6% | 0,00 |
| Menot | | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -711 200,00 | -11 200,00 | -1,6% | 101,6% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 320 | UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -711 200,00 | -11 200,00 | -1,6% | 101,6% | 0,00 |
| Menot | | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | -711 200,00 | -11 200,00 | -1,6% | 101,6% | 0,00 |
| Tulot | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Uusinvestoinnit yhteensä | -153 000,00 | -700 000,00 | -853 000,00 | -763 400,40 | 89 599,60 | 10,5% | 89,5% | -31 055,83 |
| Menot | | -163 000,00 | -700 000,00 | -863 000,00 | -763 400,40 | 99 599,60 | 11,54% | 88,46% | -40 490,23 |
| Tulot | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| Rahoitusosuudet | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

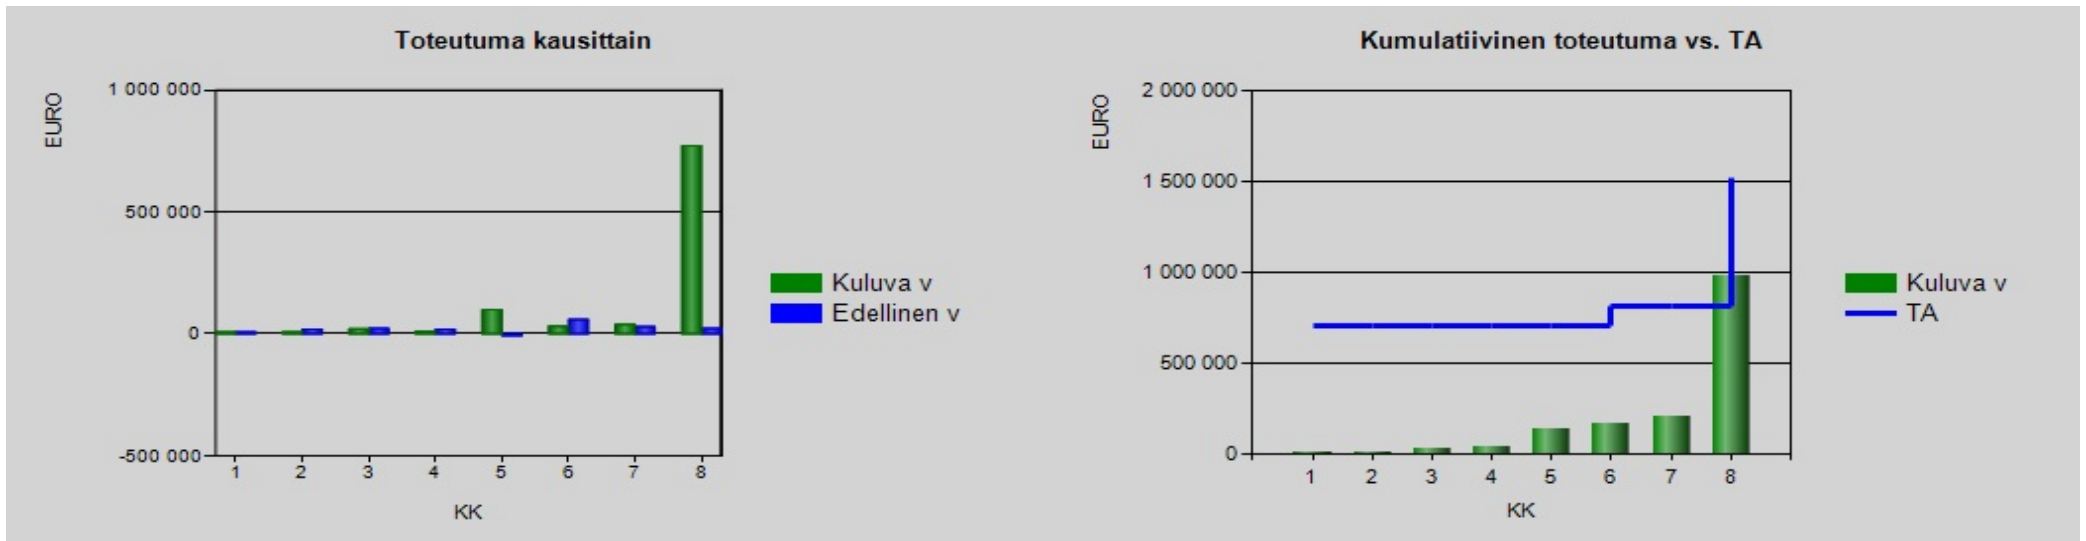

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|--------|------------------------|
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -708 000,00 | -805 800,00 | -1 513 800,00 | -975 845,00 | 537 955,00 | 35,54% | 64,46% | -162 454,64 |
| Menot | -718 000,00 | -805 800,00 | -1 523 800,00 | -975 845,00 | 547 955,00 | 35,96% | 64,04% | -171 889,04 |
| Tulot | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
| Rahoitusosuudet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -100,0% | 0,0% | 9 434,40 |
