

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
100	KI / Aineettomat oikeudet								
9560	ATK-hankinnat, U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
111	KI / Rakennukset								
9100	Kunnanvirasto, K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 451,61
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 451,61
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9130	Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 347,40	2 652,60	26,53%	73,47%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 347,40	2 652,60	26,53%	73,47%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024								
9403	Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-16 195,88
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-16 195,88
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-7 644,12	19 355,88	71,69%	28,31%	0,00
Menot		-27 000,00	0,00	-27 000,00	-7 644,12	19 355,88	71,69%	28,31%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024								
9412	Vanhustentalot, talojen raput	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024								
9431	Kirkonkyl.koulun wc-til.latt.l	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-11 855,01	-3 855,01	-48,2%	148,2%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	-11 855,01	-3 855,01	-48,2%	148,2%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ylitys, mm. lattian purku/uusiminen ja inva-wc varustelu								
9474	Koulun luokkah.vesipist.uusimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 995,65
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 995,65
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9476	Alakoulun ikkunoiden vaihtam.	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-95 842,96	24 157,04	20,13%	79,87%	0,00
Menot		-120 000,00	0,00	-120 000,00	-95 842,96	24 157,04	20,13%	79,87%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutunut suunnitellusti 31.12.2024								
9477	Kat. reunapel. uusim.ja metalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 826,36
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 826,36
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9478	Sisä-ja ulkop.korj.työt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 091,28
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 091,28
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9482	Lattioiden uusiminen	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Siirtyy vuodelle 2025								
9487	Koskipirtin kuistin katto ja m	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Torialueen sähkön jakelu suoritettu.								
9488	Keskusvaraston kylmä varastoti	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-466,20	19 533,80	97,67%	2,33%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-466,20	19 533,80	97,67%	2,33%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024									
111	KI / Rakennukset yhteensä	-254 000,00	0,00	-254 000,00	-123 155,69	130 844,31	51,5%	48,5%	-50 560,78
Menot		-254 000,00	0,00	-254 000,00	-123 155,69	130 844,31	51,5%	48,5%	-50 560,78
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Keskeneräisiin, jatkuu v. 2025									
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Todennäköisesti ei tarvitse toteuttaa.									
9308	Jääkiekkokaukalon laidat	-45 500,00	-11 000,00	-56 500,00	0,00	56 500,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-45 500,00	-11 000,00	-56 500,00	0,00	56 500,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Toteutuu syksyn aikana.									
9309	Pururadan 5 km alavien os. kor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 285,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 285,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei toimenpiteitä.									
9407	Päiväkodin muutokset/piha-alue	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-10 725,40	271,60	2,5%	97,5%	0,00
Menot		-11 000,00	0,00	-11 000,00	-10 728,40	271,60	2,5%	97,5%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Keskeneräisissä, toteutuu sunnitellusti.									
9419	Ek koulu/Pelikaukalon ruohomat	-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot		-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei toimenpiteitä.									
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-6 117,59	23 882,41	79,61%	20,39%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-6 117,59	23 882,41	79,61%	20,39%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kesken, Ollintien peruskorjaustoimenpiteitä								
9427	Louhelantien peruskorj, K, Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-85 648,06
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-85 648,06
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9430	Kuusitien ja Rantakujan perusk	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-61 535,94	13 464,06	17,95%	82,05%	-13 155,96
Menot		-75 000,00	0,00	-75 000,00	-61 535,94	13 464,06	17,95%	82,05%	-13 155,96
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Keskeneräisissä. Valmis 31.8.2024								
9442	xx VESI jatkuu 9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 485,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 485,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9450	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 526,83
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 526,83
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9453	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 526,81
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 526,81
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toimenpiteitä.								
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 420,00	6 580,00	43,87%	56,13%	-17 280,49
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 420,00	6 580,00	43,87%	56,13%	-17 280,49
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Laskutus kesken, valmistuu 31.12.2024								
9481	Salaoituksen uudistaminen D-talo	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024								
9484	Tienvarsiopasteet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Siirtyy vuodelle 2025, mahd. kuntarajamuutos									
9485	Säästötien asfaltointi	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 520,00	3 480,00	23,2%	76,8%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 520,00	3 480,00	23,2%	76,8%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.8.2024									
9490	Vellamon salaojituksen uudist.	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-268,00	17 732,00	98,51%	1,49%	0,00
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-268,00	17 732,00	98,51%	1,49%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Toteutuu osittan, jää keskeneräisiin.									
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 260,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 260,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei toimenpiteitä.									
9606	Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	27 700,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	27 700,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Todennäköisesti ei toimenpiteitä									
9607	Viemäriinjojen peruskorjaus	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	31 300,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	31 300,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Todennäköisesti ei toimenpiteitä									
9608	Puhdistamon selkeytysaltaan pi	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 973,34	-973,34	-6,08%	106,08%	0,00
Menot		-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 973,34	-973,34	-6,08%	106,08%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.8.2024, Vähäinen ylitys.									
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-333 500,00	0,00	-333 500,00	-115 563,27	217 936,73	65,3%	34,7%	-150 168,15
Menot		-333 500,00	0,00	-333 500,00	-115 563,27	217 936,73	65,3%	34,7%	-150 168,15
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
116 KI / Koneet ja kalusto									
9132	Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024


	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Mahd. toteutuu								
	116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-595 500,00	0,00	-595 500,00	-238 718,96	356 781,04	59,9%	40,1%	-206 734,49
	Menot	-595 500,00	0,00	-595 500,00	-238 718,96	356 781,04	59,9%	40,1%	-206 734,49
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Uusinvestoinnit								
	310 UI / Maa- ja vesialueet								
	9550 Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Myydyn lisäalueen tasearvo								
	310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	311 UI / Rakennukset								
	9981 KOM myynnit tehdas-tuotrak	0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00
	Hyypiänniemen ent. meijerin myynti, tasearvo								
	311 UI / Rakennukset yhteensä	0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	24 821,36	24 821,36			0,00
<hr/>									
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9311	Talviuintipaikka	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	24 000,00	100,0%	0,0%	-1 762,68
Menot		-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	24 000,00	100,0%	0,0%	-1 762,68
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Keskeneräisissä ja jatkuu vielä 2025							
9466	Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-409,25	44 590,75	99,09%	0,91%	0,00
Menot		-45 000,00	0,00	-45 000,00	-409,25	44 590,75	99,09%	0,91%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Jää keskeneräisiin.							
9472	Ihamaniemen venelaituri	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 732,85	267,15	1,78%	98,22%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 732,85	267,15	1,78%	98,22%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Valmis 30.9.2024							
9473	Uimakopin uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 856,82
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 856,82
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Ei toimenpiteitä.							
9479	Viilennyksen suun.ja tot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 516,13
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 516,13
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Ei toimenpiteitä.							
9602	Huhteluhaara Vennonmäki-Pahka	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Toteutuu suunnitellusti 31.12.2024							
9604	Alust.Jätelietteen vastaanotto	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Ei toteudu							

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00			-1 000,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00			-1 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-171 000,00	0,00	-171 000,00	1 949,61	172 949,61	101,14%	-1,14%	-42 647,16
	Menot	-171 000,00	0,00	-171 000,00	-22 937,75	148 062,25	86,59%	13,41%	-42 647,16
	Tulot	0,00	0,00	0,00	24 887,36	24 887,36			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	24 887,36	24 887,36			0,00

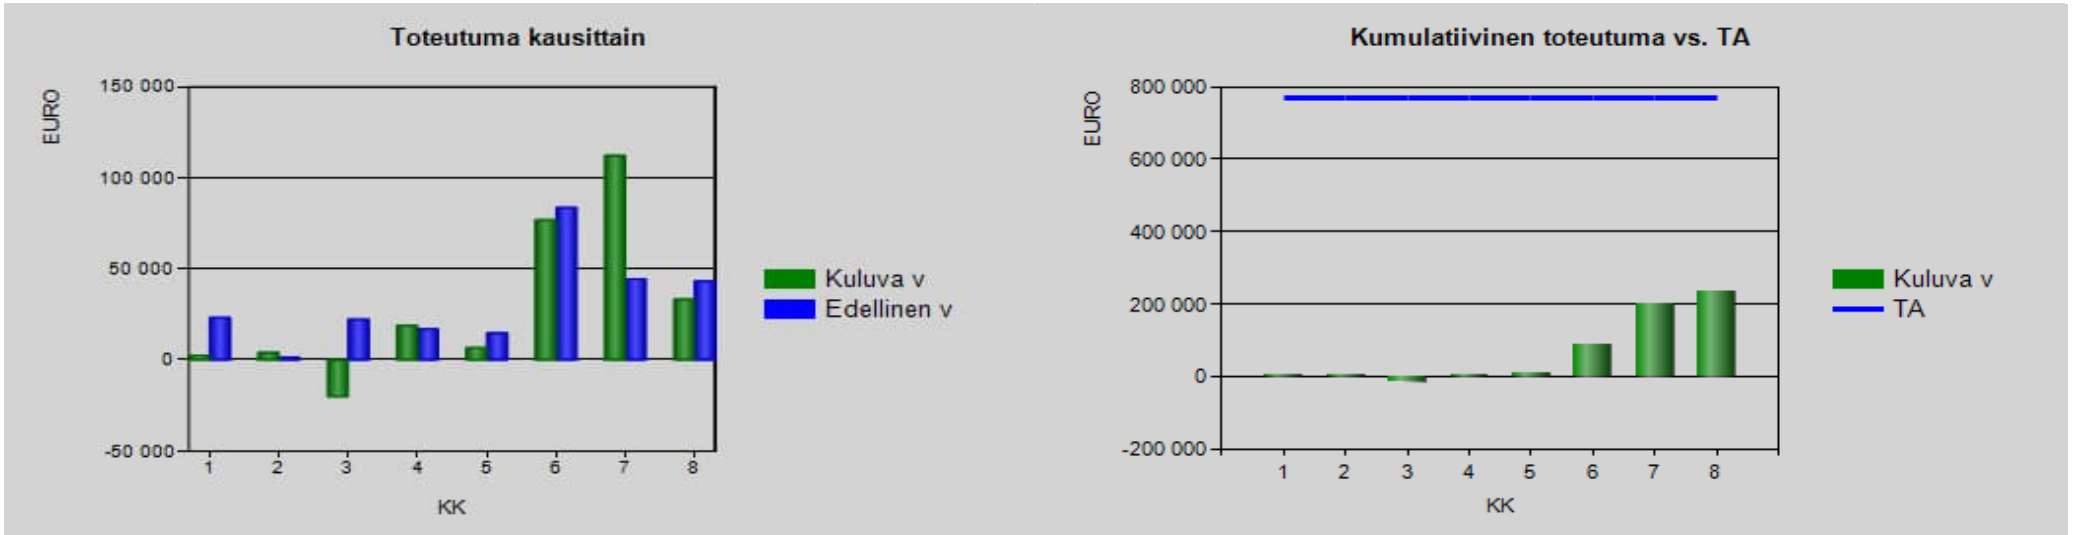

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-766 500,00	0,00	-766 500,00	-236 769,35	529 730,65	69,1%	30,9%	-249 381,65
Menot	-766 500,00	0,00	-766 500,00	-361 656,71	504 843,29	64,0%	34,1%	-249 381,65
Tulot	0,00	0,00	0,00	24 887,36	24 887,36			0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	24 887,36	24 887,36	0,00
-----------------------------	------	------	------	-----------	-----------	------
