

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
9102	Päiväkodin IVkone/sähkölyhdis	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 980,25	8 019,75	80,2%	19,8%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 980,25	8 019,75	80,2%	19,8%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Muutos + 10 000€ syksyllä Sähkö muutos tehty, IV kone asennettu, vanhojen koneiden nuohous tekemättä.								
9130	Koskenhelmen huon.kunnostus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-154,38	9 845,62	98,46%	1,54%	-7 320,76
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-154,38	9 845,62	98,46%	1,54%	-7 320,76
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suunniteltu korjauksia kiinteistökäynnin perusteella mm. ovien vaihtoa. Eloisan vuokrasopimukset edelleen avoimna								
9135	Terveysaseman korjaus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-392,38	9 607,62	96,08%	3,92%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-392,38	9 607,62	96,08%	3,92%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kuntokartoituksen mukaan pieniä korjauksia								
9315	Liiketalo, pesh putkirem/kvputk	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-7 856,74	67 143,26	89,52%	10,48%	0,00
Menot		-75 000,00	0,00	-75 000,00	-7 856,74	67 143,26	89,52%	10,48%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Muutos, peruskorjauksen suunnitteluun.								
9316	Liiksalin ja ylitil valaistus	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-3 861,00	14 139,00	78,55%	21,45%	0,00
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-3 861,00	14 139,00	78,55%	21,45%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Muutos, peruskorjauksen suunnitteluun								
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 339,79	5 660,21	56,6%	43,4%	-6 425,29
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-4 339,79	5 660,21	56,6%	43,4%	-6 425,29
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suunniteltu loppuvuonna ovien vaihtoa Eloisan vuokrasopimukset edelleen avoimna. Aurinkovarjo uusittu 2300 e								
9431	Kirkonkyl.koulun wc-til.latt.l	-13 500,00	0,00	-13 500,00	-3 754,98	9 745,02	72,19%	27,81%	-843,30
Menot		-13 500,00	0,00	-13 500,00	-3 754,98	9 745,02	72,19%	27,81%	-843,30
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Etenee, valmiusaste n. 75%								
9475	Alakou kat maal/kattoturvatuot	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-4 657,46	80 342,54	94,52%	5,48%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

	Menot	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-4 657,46	80 342,54	94,52%	5,48%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Etenee, valmiusaste n. 75%								
9482	Vellamon lattioiden uusiminen	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kilpailutuksessa								
9487	Koskipirtin korj. ja purkutyöt	0,00	0,00	0,00	-4 981,88	-4 981,88			0,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	-4 981,88	-4 981,88			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Lisämääräraha 20 k€ Ok, rakennuslupa haettava								
9492	Kk rakautomaatio / vesisulku	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Vesisulun osalta työt tilattu tehdään syskylä 2025								
9493	Kk putkiremontin suunnittelu	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-3 124,01	6 875,99	68,76%	31,24%	0,00
	Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-3 124,01	6 875,99	68,76%	31,24%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kuntokartoitus tehty								
9496	Ekoul, metallityöluokan lattia	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis, laskutus kesken, n. 5500 €. Sisäinen laskutus kesken								
9497	Keskusvar/lämpölait kattoremon	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	28 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	28 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kilpailutuksessa, toteutus syskylä 2025								
111	KI / Rakennukset yhteensä	-354 500,00	0,00	-354 500,00	-35 102,87	319 397,13	90,1%	9,9%	-15 166,33
	Menot	-354 500,00	0,00	-354 500,00	-35 102,87	319 397,13	90,1%	9,9%	-15 166,33
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

		Valmis, ylitys kun määrärahassa oli vain tarvikkeiden toimitus							
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Laitosmiehillä työnalla							
9606	Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	27 700,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	27 700,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Rikkojen varalle							
9607	Viemärlinjojen peruskorjaus	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	31 300,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	31 300,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		keskeneräisissä, rikkojen varalle							
9608	Puhdistamon selkeytysaltaan pi	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-2 285,90	15 714,10	87,3%	12,7%	-16 973,34
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-2 285,90	15 714,10	87,3%	12,7%	-16 973,34
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Valmisteltu, ohjelmassa lokakuussa							
9611	Vesi/viemverkos kv tarkastelu	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 108,75	6 891,25	45,94%	54,06%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 108,75	6 891,25	45,94%	54,06%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Valmis							
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-224 000,00	-17 500,00	-241 500,00	-44 690,82	196 809,18	81,49%	18,51%	-96 396,99
Menot		-224 000,00	-17 500,00	-241 500,00	-44 690,82	196 809,18	81,49%	18,51%	-96 396,99
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-578 500,00	-17 500,00	-596 000,00	-79 793,69	516 206,31	86,61%	13,39%	-111 563,32
Menot		-578 500,00	-17 500,00	-596 000,00	-79 793,69	516 206,31	86,61%	13,39%	-111 563,32
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 000,00	5 000,00	25,0%	75,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 000,00	5 000,00	25,0%	75,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Padelkentän hankinta, valmis									
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 000,00	5 000,00	25,0%	75,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 000,00	5 000,00	25,0%	75,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24 821,36


313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9311	Talviuintipaikka	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-160,81	7 839,19	97,99%	2,01%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	-160,81	7 839,19	97,99%	2,01%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Jatkuu kausi 2025-2026									
9313	Tervaran. rannan laituri-teräs	0,00	0,00	0,00	-5 410,60	-5 410,60			0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-5 410,60	4 589,40	45,89%	54,11%	0,00
Tulot		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Valmis									
9466	Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-32 500,00	0,00	-32 500,00	-9 000,67	23 499,33	72,31%	27,69%	-409,25
Menot		-32 500,00	0,00	-32 500,00	-9 000,67	23 499,33	72,31%	27,69%	-409,25
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmistuu 2025									
9491	Ollintien asfaltointi	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Suunniteltu syksyn aikana toteutettavaksi									
9604	Alust.Jäteliikkeen vastaanotto	-37 000,00	0,00	-37 000,00	-4 690,00	32 310,00	87,32%	12,68%	0,00
Menot		-37 000,00	0,00	-37 000,00	-4 690,00	32 310,00	87,32%	12,68%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Selvitys tehty, suunnitteluvaihe meneillään. Toteutus jäänee 2026 (vuodenvaihde)									
9610	Ylävessäi,vk kierreport/kattok	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

	Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Portaat tilattu, pohjan teko meneillään								
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-112 500,00	0,00	-112 500,00	-19 262,08	93 237,92	82,88%	17,12%	-409,25
	Menot	-122 500,00	0,00	-122 500,00	-19 262,08	103 237,92	84,28%	15,72%	-409,25
	Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
	Rahoitusosuudet	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
316	UI / Koneet ja kalusto								
9314	Liikuntatoimen kalustohankin	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,87	-0,87	-0,01%	100,01%	0,00
	Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,87	-0,87	-0,01%	100,01%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis,								
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Varalla								
9495	E.koulu, ruokalan penkit	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-6 380,00	5 620,00	46,83%	53,17%	0,00
	Menot	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-6 380,00	5 620,00	46,83%	53,17%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis								
9561	Palvelin (ICT)	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei tarvetta								
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-43 000,00	0,00	-43 000,00	-14 380,87	28 619,13	66,56%	33,44%	0,00
	Menot	-43 000,00	0,00	-43 000,00	-14 380,87	28 619,13	66,56%	33,44%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
9980	Osakkeiden osto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 000,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 000,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2024 vuoden investointi								
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 000,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-175 500,00	0,00	-175 500,00	-48 642,95	126 857,05	72,28%	27,72%	22 412,11
	Menot	-185 500,00	0,00	-185 500,00	-48 642,95	136 857,05	73,78%	26,22%	-2 409,25
	Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	24 821,36
	Rahoitusosuudet	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24 821,36

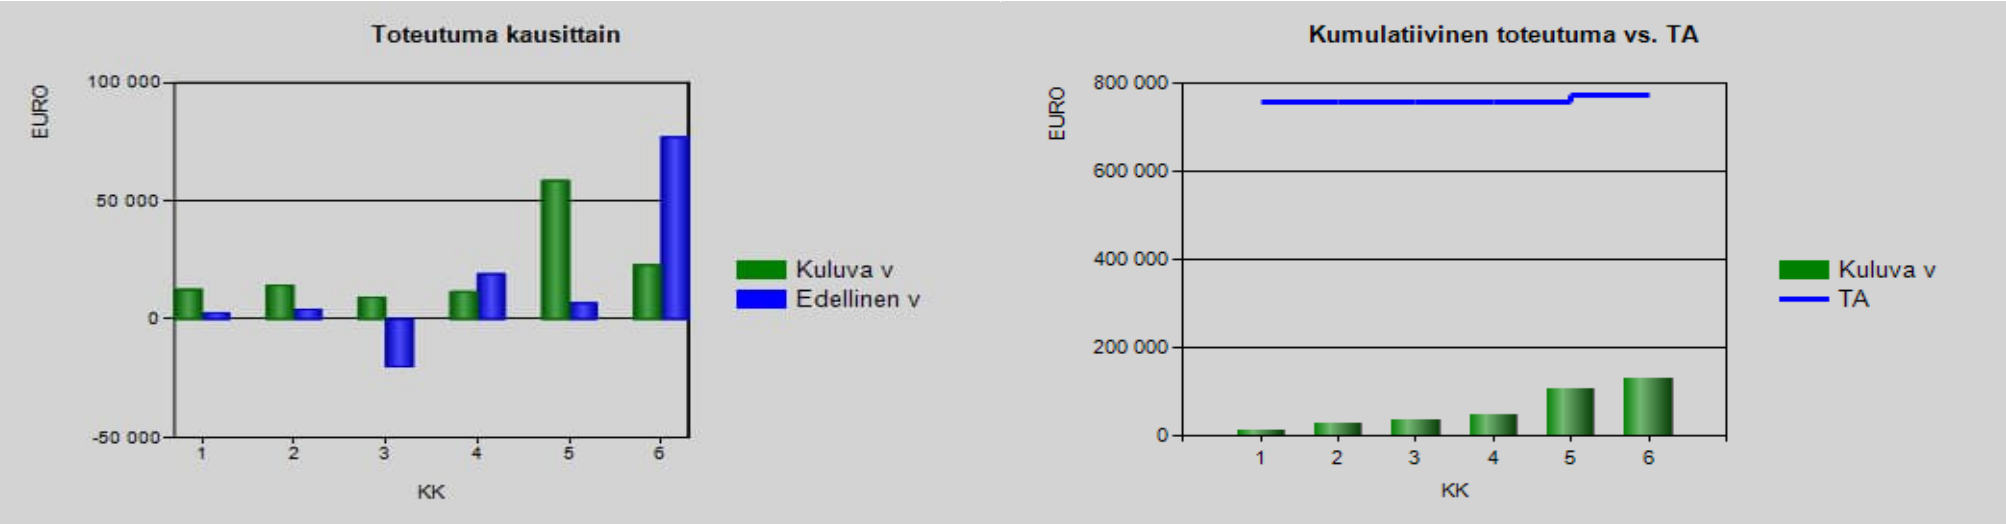

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-754 000,00	-17 500,00	-771 500,00	-128 436,64	643 063,36	83,35%	16,65%	-89 151,21
Menot	-764 000,00	-17 500,00	-781 500,00	-128 436,64	653 063,36	83,57%	16,43%	-113 972,57
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	24 821,36
Rahoitusosuudet	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 821,36
-----------------------------	------	------	------	------	------	-----------
